„Kerékpársáv és csapadékvíz elvezetés építése Pilisen tervezés és kivitelezés, 2. rész: Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 2.123 fm hosszúságban” című projekt, kivitelezési munkái

Műszaki ütemterv csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése építése

	Tevékenység megnevezése	hossz (fm)	Munkavégzés Kezdés	Befejezés
	Szerződés kötés jogerőre e melkedése		**2019.01.23**	**2020.02.14**
1.	**Kivitelezési dokumentáció készítése**		**2020.02.14**	**2020.03.31**
1.1.	Kivitelezési dokumentáció készítése		2020.02.14	2020.03.31
1.2	Anyagbeszerzés			2020.04.09
2.	**Csapadék csatorna építés 1-0-0; 1-1-0**	**1010**	**2020.04.14**	**2020.08.19**
2.1.	Terület elökészítés, bontási munkák		2020.04.14	2020.06.05
2.2.	Kotrás, cső, mederelem, áteresz építés		2020.05.18	2020.08.14
2.3.	Terület helyreállítási munkák		2020.06.15	2020.08.19
3.	**Csapadék csatorna építés 1-1-1; 1-2-0**	**662**	**2021.03.16**	**2021.05.31**
3.1.	Terület elökészítés, bontási munkák		2021.03.16	2021.04.24
3.2.	Kotrás, cső, mederelem, áteresz építés		2021.04.06	2021.05.31
3.3.	Terület helyreállítási munkák		2021.04.27	2021.05.31
4.	**Csapadék csatorna építés 2-0-0; 2-1-0; 3-0-0**	**460**	**2020.08.24**	**2020.10.22**
4.1.	Terület elökészítés, bontási munkák		2020.08.24	2020.09.285
4.2.	Kotrás, cső, mederelem, áteresz építés		2020.09.14	2020.10.16
4.3.	Terület helyreállítási munkák		2020.10.05	2020.10.22
	Műszaki átadás-átvételi eljárás		**2020.08.31**	**2021.06.25**

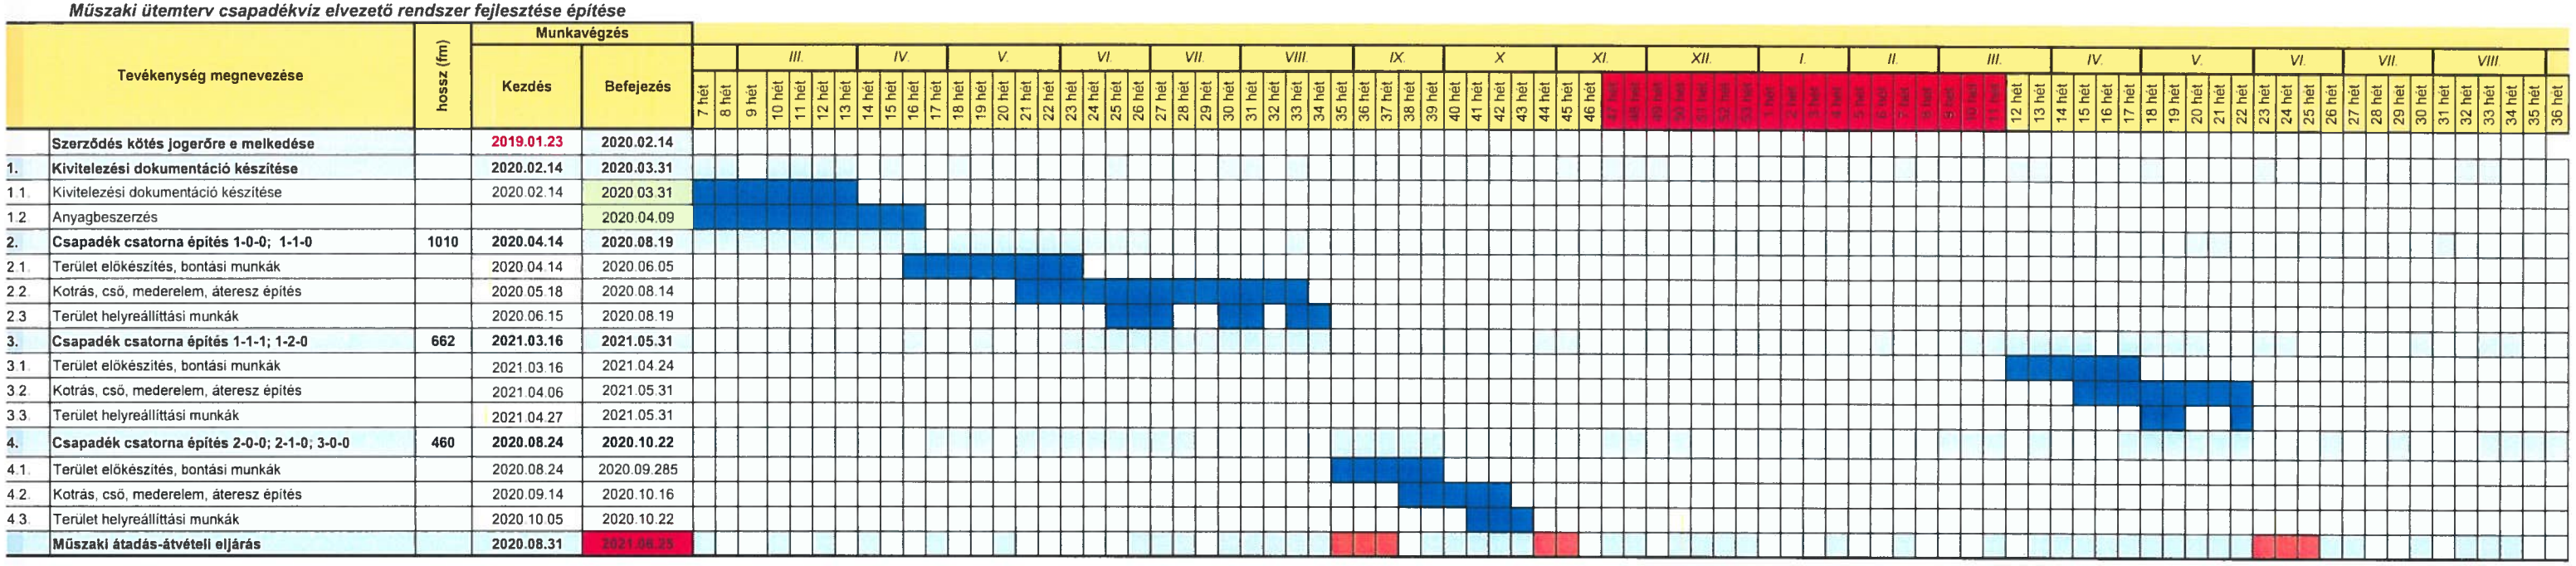

„Kerékpársáv és csapadékvíz elvezetés építése Pilisen tervezés és kivitelezés, 1. rész: Kerékpársáv létesítése a közút szélesítésével 1.071 fm hosszúságban” című projekt, kivitelezési munkái

Műszaki ütemterv kerékpár sáv építése közút szélesítésével
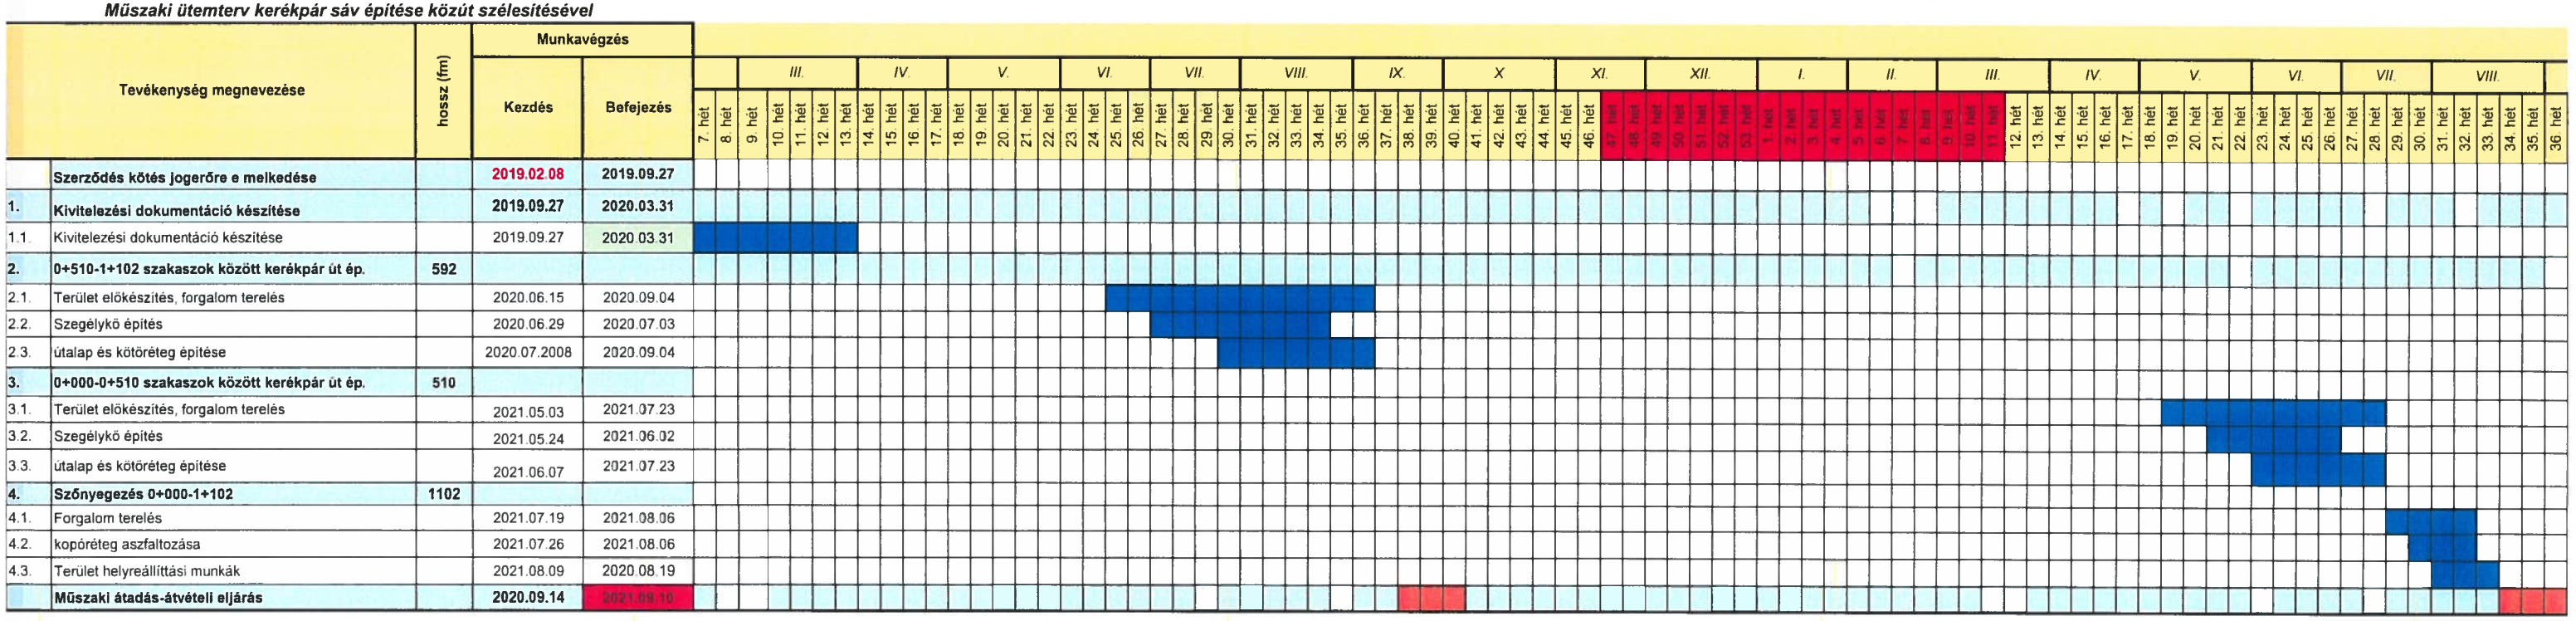
	Tevékenység megnevezése	hossz (fm)	Munkavégzés Kezdés	Befejezés
	Szerződés kötés jogerőre e melkedése		**2019.02.08**	**2019.09.27**
1.	**Kivitelezési dokumentáció készítése**		**2019.09.27**	**2020.03.31**
1.1.	Kivitelezési dokumentáció készítése		2019.09.27	2020.03.31
2.	**0+510-1+102 szakaszok között kerékpár út ép.**	**592**		
2.1.	Terület előkészítés, forgalom terelés		2020.06.15	2020.09.04
2.2.	Szegélykö építés		2020.06.29	2020.07.03
2.3.	útalap és kötöréteg építése		2020.07.2008	2020.09.04
3.	**0+000-0+510 szakaszok között kerékpár út ép.**	**510**		
3.1.	Terület előkészítés, forgalom terelés		2021.05.03	2021.07.23
3.2.	Szegélykö építés		2021.05.24	2021.06.02
3.3.	útalap és kötöréteg építése		2021.06.07	2021.07.23
4.	**Szőnyegezés 0+000-1+102**	**1102**		
4.1.	Forgalom terelés		2021.07.19	2021.08.06
4.2.	kopóréteg aszfaltozása		2021.07.26	2021.08.06
4.3.	Terület helyreállítási munkák		2021.08.09	2020.08.19
	Műszaki átadás-átvételi eljárás		**2020.09.14**	**2021.09.10**
